

INFORME EJECUTIVO

AVANCE DEL PLAN MAESTRO DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO – HUILA**

NIT. 891.180.134 – 2

Pitalito, 26 de Septiembre de 2022

**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente**

Contenido

JUSTIFICACIÓN	3
1. RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	4
2. AVANCES DEL PLAN MAESTRO DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.....	33
3. PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN EL PLAN BIENAL 2022-2023.....	35
4. PROYECTOS PRIORIZADOS 2020-2024	37
- Anexo No. 1 – Acuerdo No. 009 de 27 de Septiembre de 2018 – Por el cual se aprueba el Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito	38

JUSTIFICACIÓN

El presente informe ejecutivo, permite evidenciar el avance en las inversiones realizadas en infraestructura de nuestra E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, para el período comprendido del 1 de abril de 2012 hasta la fecha, el cual obedece a las diferentes gestiones realizadas para dar respuesta a nuestro modelo de atención centrada en el paciente y su familia, que son la columna vertebral de los procesos de la institución, y en cumplimiento del Plan de Gestión **“Desarrollo y Transformación Hospitalaria Con Gestión Humana”** 2020-2024.


En el desarrollo de nuestra infraestructura hospitalaria, se ha tenido en cuenta el comportamiento de las primeras causas de morbilidad atendidas, las estadísticas de las patologías remitidas por parte del primer nivel de atención del área de influencia y aquellas que se realizan a niveles de mayor complejidad. De otra parte, los proyectos de infraestructura han sido socializados y concertados con la comunidad a través del ejercicio de la rendición de cuentas en cada vigencia.

Se ha logrado dar un orden y ejecución del desarrollo institucional a través del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria, lo cual ha permitido avanzar positivamente en la oferta de servicios y procedimientos de mediana y alta complejidad.

Por último, se ha contado con un valioso trabajo en equipo y una administración eficiente de los recursos públicos, que gracias a la rentabilidad financiera se ha podido reinvertir en gran manera recursos propios para el desarrollo institucional, y gracias al proceso del ciclo de preparación para el logro de la Acreditación en Salud, se han articulado toda una serie de estrategias y acciones para posicionar nuestra E.S.E. a nivel regional, departamental y nacional, para el beneficio de nuestras comunidades.

1. RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Antes de dar el detalle de las inversiones realizadas en infraestructura hospitalaria, es importante contextualizar que gracias a las gestiones del recaudo de las cuentas por cobrar (cartera) y la calidad lograda en los diferente procesos asistenciales y administrativos, se ha avanzado significativamente en el superávit financiero vigencia tras vigencia, pasando en el 2012 de \$2.177 millones al más alto logrado en la historia en la institución para la vigencia 2021 de \$21.499 millones, como se evidencia a continuación:

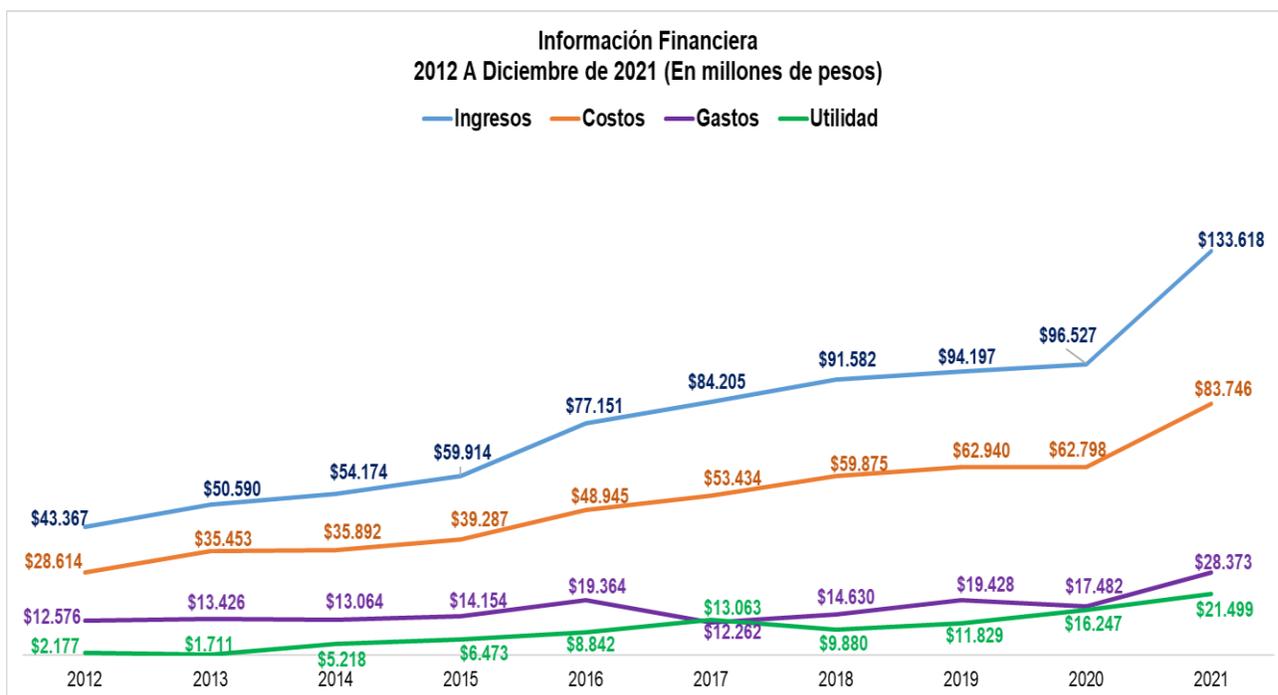

La reinversión de los anteriores recursos propios, han permitido el desarrollo hospitalario, y una transformación cultural para la oferta con calidad de nuestros servicios de salud y una mejora continua en todos los procesos institucionales; debido a que en el consolidado del período 2012 a 2021 se realizaron inversiones en el orden de \$37.829 millones en los conceptos de Equipo de transporte, muebles, enseres, equipo de oficina y de apoyo, otras gestiones en calidad, sistemas de información, equipo médico y científico, y la infraestructura hospitalaria, como se detalla a continuación:



Como se aprecia en la imagen anterior el mayor esfuerzo en inversiones ha sido orientado a la infraestructura hospitalaria (\$18.533 millones) que abarca el desarrollo de proyectos y la diferentes adecuaciones y remodelaciones de los espacios físicos. En cuanto a las fuentes de financiamiento tenemos que la principal ha sido nuestros recursos propios que para efectos del consolidado citado equivalen al 76,29% (\$28.858 millones), a continuación, el detalle de éstas:

Fuentes de las Inversiones Realizadas 2012 A 2021

Fuentes	Valores en millones de pesos	Part. %
Recursos Propios del Hospital	\$ 28.858	76,29%
Departamento del Huila	\$ 4.461	11,79%
Minsalud	\$ 2.466	6,52%
Otras Fuentes	\$ 2.044	5,40%
TOTALES	\$ 37.829	100,00%

Con base en lo expuesto anteriormente, se detalla por vigencia los conceptos y las inversiones realizadas en materia de infraestructura hospitalaria:

No.	CONCEPTO	En millones de pesos
1	Terminación de la construcción del servicio de urgencias y obras de urbanismo (Fase I).	\$ 2.707
Subtotal Vigencia 2013		\$ 2.707
Vigencia 2014:		
2	Ampliación y remodelación de la Unidad de Urgencias (Fase II).	\$ 1.330
3	Páneles solares para el suministro de agua caliente.	\$ 300
4	Adecuación y remodelación de espacios físicos - Bogega Tía Mónica.	\$ 25
5	Construcción, remodelación y Adecuación del Área de Facturación Hospitalización y del Depósito para material reciclable.	\$ 18
6	Obras de remodelación para la prestación de servicios: Gastroenterología, Plan de Contingencia de Urgencias y Entrada Principal.	\$ 339
Subtotal Vigencia 2014		\$ 2.012

- Se avanzó en la fase I y II del servicio de la Unidad de Urgencias, logrando su modernización junto con la dotación de equipos biomédicos, no biomédicos y la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo funcional acorde al tipo de pacientes de acuerdo a la clasificación del Triage. En el 2014, se desarrollaron obras complementarias y una de ellas fue la denominada “Plan de Contingencia de Urgencias”, la cual quedó con los servicios de todas las conexiones eléctricas, gases medicinales, baños y puesto de enfermería. Ésta área en su momento se utilizó el 50% para el funcionamiento de la mesa de ayuda de nuestros sistemas de información y el otro 50% como auditorio para las respectivas capacitaciones de todo el personal. En el 2020, dicha área fue de gran utilidad porque fue una de las primeras en utilizarse para el Plan de Contingencia COVID-19.


- Los Paneles Solares para el suministro de agua caliente, éste proyecto ha contribuido en la humanización del servicio de hospitalización, tanto para los usuarios que madrugan a su baño matutino con agua tibia (anteriormente solo con agua fría) y para nuestras Auxiliares de enfermería quienes anteriormente calentaban el agua a primeras horas de la mañana en estufas eléctricas para el uso de los pacientes; de otra parte se ha impactado el medio ambiente y los costos por consumo de energía eléctrica.

- La Adecuación y remodelación de los espacios físicos de la bodega conocida como “Tía Mónica”, en su momento se realizaron para poder sacar el archivo central de historias clínicas que ocupaba un gran espacio en el Hospital, de otra parte para contar con espacios para el archivo central administrativo y los inventarios fijos de equipos biomédicos y no biomédicos que eran utilizados como de respaldo o estaban pendiente de reparación o en su defecto darlos de baja; también se adecuaron espacios para el inventario de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico; por cuanto todo lo anterior no contaba con espacio en las antiguas áreas de almacén y farmacia en el hospital, debido al crecimiento en las unidades de producción y servicios.

- Una vez agotado el proyecto anterior, se procedió a la remodelación y adecuación para la puesta en servicio de la Unidad de Gastroenterología, entrada principal, recepción y servicios de facturación en hospitalización para el beneficio de nuestros usuarios y eficiencia en los procesos de nuestros colaboradores.

Unidad de Urgencias (Fase I y II)



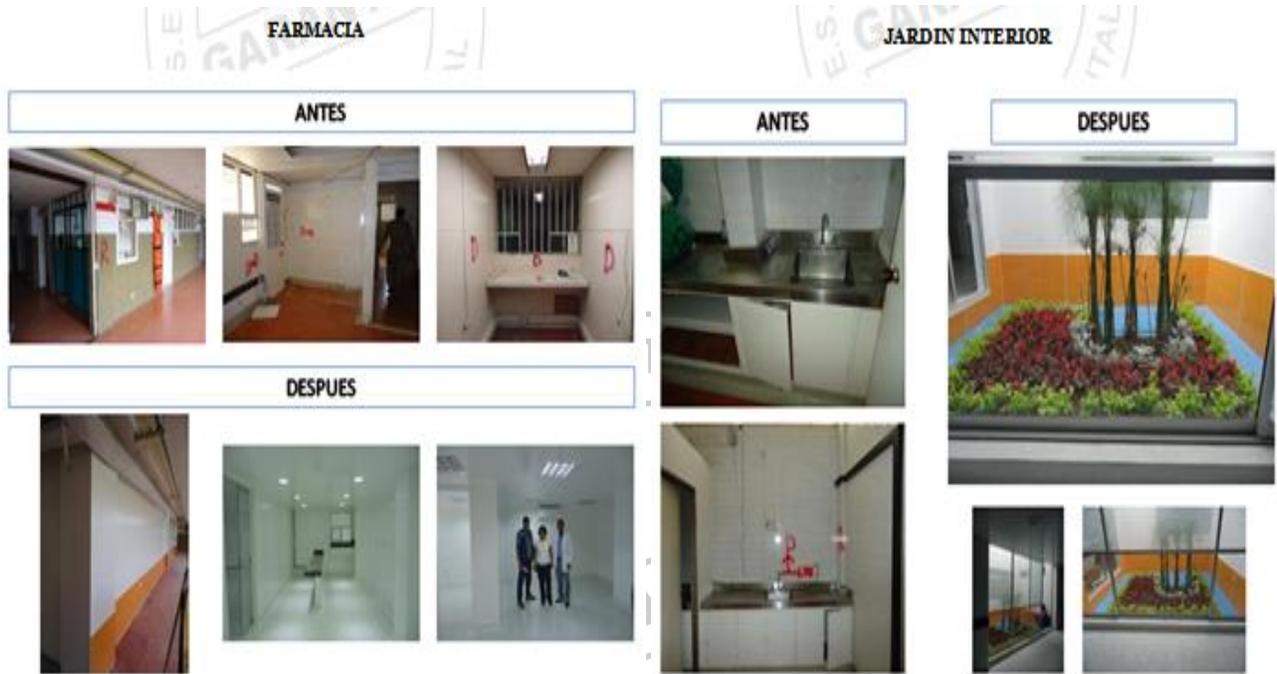

Facturación Hospitalización
ANTES

Archivo de Historias Clínicas: Unidad de Gastroenterología
DEPUÉS



DURANTE




DESPUES



Plan de Contingencia de Urgencias: Auditorios

DESPUÉS

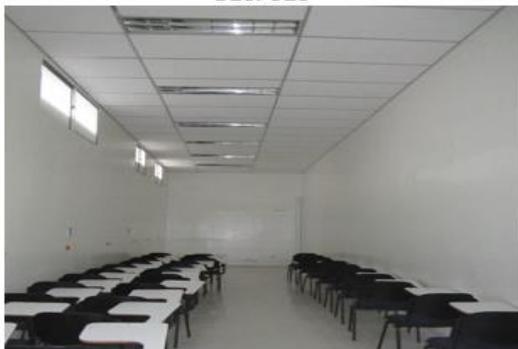

Entrada Principal y Recepción

ANTES



Entrada Principal y Recepción

DESPUÉS



No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2015:		
7	Construcción a todo costo Plazoleta Principal.	\$ 222
Subtotal Vigencia 2015		\$ 222

La Plazoleta de San Antonio, se ha convertido en la sala principal de nuestros usuarios y sus familias, donde cómodamente esperan su turno para los servicios ambulatorios, esperan los familiares durante los procedimientos quirúrgicos, entre otros; también es por ahora el sitio ideal para la integración de actividades de todo tipo entre los Colaboradores, Usuarios, sus Familias y grupos de interés.

ANTES



DESPUÉS



No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2016:		
8	Construcción y puesta en funcionamiento a todo costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR.	\$ 672
9	Adecuación y remodelación a todo costo de la Unidad de Imagenología, incluida el área para la puesta en funcionamiento del Resonador Magnético Nuclear.	\$ 602
Subtotal Vigencia 2016		\$ 1.275

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR-, es una de las muestras de nuestro compromiso de la Responsabilidad Social Empresarial, para con el medio ambiente y el uso del recurso hídrico. Se realizan los respectivos procedimientos, se evalúan y se hacen seguimientos a sus indicadores, logrando excelentes resultados que son certificados por La CAM. Gracias a ese trabajo articulado recibimos el reconocimiento **“OPITA DE CORAZÓN”**.

La adecuación y remodelación de la Unidad de Imagenología, nos permitió dar un gran salto tecnológico, al poder contar con tecnología de punta para tener unos mejores diagnósticos, y vincular de ésta manera nuevos servicios especializados. Se ha podido dar un manejo óptimo y oportuno a nuestros pacientes en especial en la detección temprana de tumores. La dotación fue biomédica y no biomédica en la unidad, en especial con equipos especializados como EL TAC y El Resonador Magnético Nuclear.

PTAR



UNIDAD DE IMAGENOLÓGÍA



Unidad de Imagenología

TAC



RMN



Servicio de Resonancia Manética Nuclear



Servicio de Resonancia Magnética Nuclear

No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2017:		
10	Construcción a todo costo de cárcamos para cuartos técnicos.	\$ 30
11	Construcción de la red de aguas lluvias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR.	\$ 48
12	Adecuación de Tanques de Almacenamiento de Agua, utilizando materiales sólidos, impermeables y resistentes a los procesos de limpieza y desinfección.	\$ 33
Subtotal Vigencia 2017		\$ 111

El Hospital fue escogido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, como referente para la medición del Índice de Seguridad Hospitalaria, logrando uno de los mejores resultados a nivel nacional, producto de ello recibió transferencias para continuar en esa línea y mejorar aún más dicho indicador global en cuanto la infraestructura y el aseguramiento de muebles y equipos de cómputo. De otra parte, con recursos propios se intervino infraestructura como la relacionada en la tabla anterior.

Tanques de Almacenamiento de Agua



Cárcamos para Cuartos Técnicos



No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2018:		
13	Adecuación de la Infraestructura Física de la Central de Esterilización.	\$ 29
14	Ampliación y remodelación del Área de Hospitalización Pensión en La E.S.E. (14 Suites de Hotelería Hospitalaria)	\$ 2.740
15	Mantenimiento y Restauración Pintura del Mural "Apología a la Vida", ubicado en la fachada principal de La E.S.E.	\$ 25
16	Remodelación y ampliación a todo costo del Área de Trauma en la Unidad de Urgencias.	\$ 120
Subtotal Vigencia 2018		\$ 2.914

A partir del 27 de septiembre de 2018, entró en vigencia el Acuerdo No. 009 de Junta Directiva, por medio del cual se aprobó el Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria de nuestra institución, y en su primera etapa contempla:

- ETAPA 1. Reordenamiento de los Servicios de Apoyo Logístico (Diseños y obras en la vigencia 2018), como:


- Bodega
- Parqueaderos para vehículos automotores de La E.S.E. HSP y módulo de limpieza y desinfección de las Ambulancias.
- Área de Servicios Generales

ÁREAS ACTUALES

- Zona verde y antigua sede de la Cruz Roja.



ÁREAS PROYECTADAS

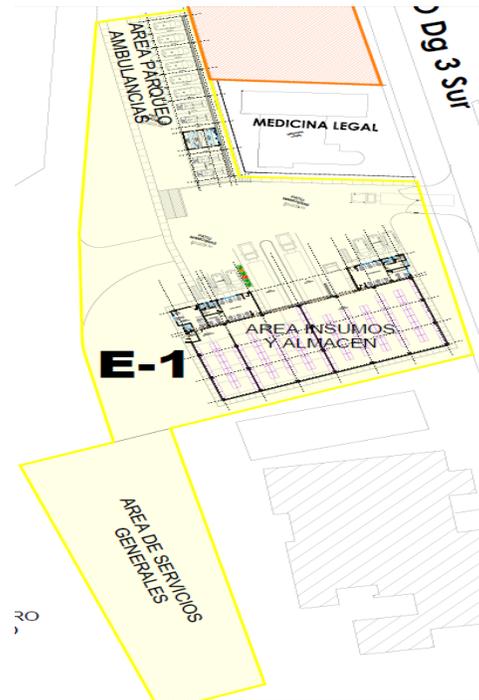

Sumado a las gestiones de los proyectos para la Etapa 1, se pudieron adelantar las obras de la tabla anterior, donde la más representativa fue la ampliación y remodelación del área de hospitalización pensión conocida como las 14 Suites de Hotelería Hospitalaria. Ésta importante obra permitió dar solución a la necesidad de camas en el servicio de hospitalización, pero con factores diferenciadores de confort, seguridad del paciente, humanización, mitigación de riesgos y tecnología de punta. Las 14 Suites de Hotelería Hospitalaria, nos ha servido en gran manera para manejo de pacientes aislados y en especial aquellos afectados por COVID-19, ha gozado de gran reconocimiento por parte de los usuarios, sus familias y colaboradores.

**Restauración Mural
“Apología a la Vida”**



Área de Trauma



Central de Esterilización



14 Suites de Hotelería Hospitalaria



No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2019:		
17	Construcción del Módulo de Limpieza y Desinfección de Ambulancias y Parqueo Automotor Hospitalario.	\$ 828
18	Construcción de un Control de Monitoreo, apoyo a la gestión de enfermería para áreas de hospitalización y obras	\$ 402
19	Reposición de pisos tipo noraplan signa y obras complementarias en la Unidad de Ginecobstetricia.	\$ 112
20	Suministro e instalación equipo de bombeo horizontal para el tanque de la red contra incendios en el área de hospitalización.	\$ 355
21	Obras Complementarias y Eléctricas a todo costo en La E.S.E.	\$ 699
22	Ampliación del Servicio de Agua Caliente para las 14 suites de Hotelaria Hospitalaria.	\$ 11
23	Construcción de cuarto técnico (Planta Eléctrica)	\$ 8
24	Construcción Acometidas Eléctricas en La E.S.E.	\$ 92
Subtotal Vigencia 2019		\$ 2.507

Durante el 2019, se avanzó en El Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria Institucional, al poner en funcionamiento el Módulo de Limpieza y Desinfección de Ambulancias y Parqueo Automotor Hospitalario, área que no tenía el hospital para ubicar y salvaguardar los vehículos y ambulancias del Hospital, así como el desarrollo para su respectiva limpieza y desinfección. Éste importante proyecto, ha sido de vital importancia por cuanto en tiempos de pandemia COVID-19 fue de gran ayuda y el área como tal ha servido como auditorio para las capacitaciones al personal, reuniones y rendiciones de cuentas a la comunidad, entre otros usos.

Las otras obras relacionadas fueron de apoyo para la mejora continua de los servicios de hospitalización, consulta externa y la unidad de Ginecobstetricia, al igual que las mejoras en materia de infraestructura eléctrica debido a la adecuación de una planta eléctrica que fue donada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Pisos Noraplan Signa y Otros – Unidad de Ginecología y Obstetricia



Obras Complementarias y Eléctricas



Cuarto Técnico – Planta Eléctrica -

Control de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Enfermería - Hospitalización



Módulo de Limpieza, Desinfección de Ambulancias y Parqueo Automotor Hospitalario



No.	CONCEPTO	En millones de pesos
Vigencia 2020:		
25	Construcción de Una Bodega Tipo Industrial para el Almacén y Suministros	\$ 3.233
26	Remodelación y ampliación a todo costo del Área Administrativa	\$ 215
Subtotal Vigencia 2020		\$ 3.448

Durante el 2020, se avanzó en la Etapa 1 del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria Institucional, al construir la Bodega Tipo Industrial para Almacén y Suministros, proyecto que venía gestionándose desde el 2017, logrando consolidar una construcción de 1.754,01 m² y una capacidad volumétrica de 4.811,85 m³, dando respuesta a las necesidades de apoyo logístico y administrativo, en lo relacionado con los procesos de almacén y suministro (selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de inventarios, distribución, dispensación, entre otros), conforme a lo exigido normativamente vigente en materia de habilitación y

fortaleciendo los procesos de mejora continua soportados en los ejes transversales del Sistema Único de Acreditación (SUA). De esta manera, se logró ampliar la capacidad instalada de los citados procesos, y proyectada en el mediano y largo plazo, para atender la demanda de los insumos de los actuales servicios y áreas administrativas, al igual que para los futuros proyectos de éstos contemplados en el “**Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios E Infraestructura Hospitalaria**”. Ésta importante obra contribuye con un gran impacto positivo en el desarrollo institucional, permitiendo liberar espacios de áreas administrativas que serán intervenidas próximamente, para reorganizar y ofertar nuevos servicios asistenciales de mediana y alta complejidad para el beneficio de nuestra comunidad Surcolombiana.

La otra obra, fue la remodelación y ampliación del área administrativa del piso 2, por cuanto se incrementaron los procedimientos en Talento Humano y Calidad, realizando una reubicación también de los procesos de gestión jurídica, estadística, planeación operativa y una sala de juntas para las reuniones de los equipos conformados para el avance de la Acreditación Institucional.

Remodelación y Ampliación del Área Administrativa – Piso 2



Bodega Industrial Hospitalaria
(Antes)



Bodega Industrial Hospitalaria
(Durante)





Bodega Industrial Hospitalaria



Vigencia 2021 – Suministro e instalación de rack selectivo, y demás elementos necesarios para la adecuación y puesta en funcionamiento de la Bodega Industrial Hospitalaria (\$374 millones).





Vigencia 2021 – Construcción del Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas (\$236 millones).






Vigencia 2021 – Mejoramiento de las Obras de Comunicación Interna de las Áreas Asistenciales y de Apoyo de Servicios Generales del Hospital (\$891 millones). Obra trascendental para la comunicación de los procedimientos ubicados en áreas de bodega industrial hospitalaria con el resto de servicios asistenciales y de apoyo; así como la proyección de vías vehiculares y peatonales para el desarrollo institucional contenido en las etapas del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria.

(Antes)



(Después)

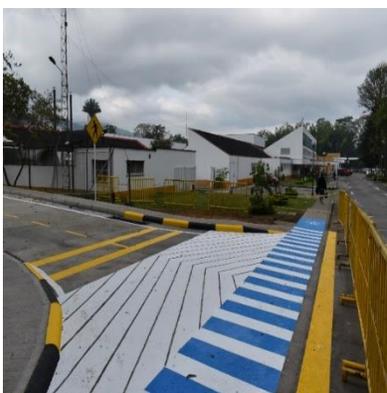

Vigencia 2021

**Renovación Tecnológica:
Nuevo Tomógrafo Axial
Computarizado de
128 cortes
Referencia: INCISIVE CT
Marca: PHILIPS**



En el 2021 se realizó la renovación tecnológica del Tomógrafo Axial Computarizado, pasando de un equipo Brivo 385 multicorte de 16 cortes de la General Electric, modelo 2014, a un equipo altamente tecnológico y de vanguardia, un Philips referencia INCISIVE CT de 128 cortes, proporcionando una mínima radiación mayor calidad, eficiencia, efectividad y mejor detalle diagnóstico. Uno de los grandes beneficios es poder realizar colonoscopias virtuales, la posibilidad de hacer estudios cardíacos y vasculares con relevante detalle, entre otras ventajas comparativas; fortaleciendo de ésta manera la seguridad del paciente y demás ejes del SUA.

Vigencia 2022 – Proyectos en Desarrollo que serán puestos en funcionamiento antes de finalizar la vigencia.

1. Construcción, remodelación y reforzamiento a todo costo de las áreas de financiera, subgerencia técnico científica, baños, portería, cuentas médicas, entre otras áreas del Hospital (\$3.600 millones). Obra de gran importancia, cuya mayor intervención consiste en las antiguas áreas administrativas (planeación operativa, control interno, mantenimiento, cuentas médicas, almacén, entre otros), para hacer una reorganización administrativa en la cual se pueda sumar el área financiera (presupuesto, costos, contabilidad, cartera y tesorería); para de esta manera liberar dichos espacios y proceder a la intervención de la Etapa 2 del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria y poder de ésta manera ampliar los servicios especializados de Consulta Externa, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.

Registro Fotográfico Avance de Obras (26 de septiembre de 2022)





Vigencia 2022 – Proyectos en Desarrollo que serán puestos en funcionamiento antes de finalizar la vigencia.

2. Construcción, adecuación y reorganización a todo costo del Archivo General del Hospital (\$2.860 millones). Obra que se desarrolla en la casa propiedad del Hospital conocida como “Tía Mónica”, donde ha funcionado el archivo central y hasta el 2020 funcionó como un área para almacenamiento de activos fijos y medicamentos, entre otros. Con ésta intervención, se busca dar solución a las dificultades que se ha tenido con el archivo central (Historias Clínicas y administrativo), para poder dar cumplimiento a los requerimientos en la materia (Ley General de Archivo) y salvaguardar la información producida por todos los medios (escrita, digital, audiovisual, entre otros), garantizando su conservación y consulta en forma eficiente y eficaz.

Registro Fotográfico Avance de Obras (26 de septiembre de 2022)



Trazabilidad del Proyecto: “Construcción de la Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito”.

1. Aprobado en Plan Bienal 2018-2019 Ajuste 2.
2. La Versión 3 – De la Capacidad Instalada – fue aprobada por La Secretaría de Salud del Huila en febrero de 2022.
3. El 25 de marzo de 2022, se emitió el Concepto Técnico Favorable de la Capacidad Instalada (incluido el PMA- Programa Médico Arquitectónico) y del Componente Financiero por La Secretaría de Salud del Huila.
4. El 3 de mayo de 2022, se emitió el Acta No. 01 de Concertación de la Capacidad Instalada, entre El Ministerio de Salud y Protección Social, La Secretaría de Salud del Huila y El Hospital.
5. El 25 de julio de 2022, se emitió Concepto Técnico Favorable a la Propuesta Arquitectónica por La Secretaría de Salud del Huila y fue remitido a Minsalud.
6. El 25 de agosto de 2022, el 2 y 5 de septiembre de 2022, se realizaron mesas técnicas para revisión, ajuste, hasta lograr la aprobación de la Propuesta Arquitectónica por Minsalud.
7. A la fecha, la institución adelanta los respectivos estudios y diseños del proyecto para consolidar la información requerida y ser presentado el proyecto en su totalidad a La Secretaría de Salud del Huila para su respectiva viabilidad y posterior remisión a Minsalud para lo pertinente.

- La Capacidad Instalada aprobada del proyecto, consta de:

Servicio	Capacidad de Cunas/ Incubadoras (Camas)
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal	15
Unidad de Cuidado Intermedio Neonatal	5
Unidad de Cuidado Básico Neonatal	10
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	7
Unidad de Cuidado Intermedio Pediátrica	3
TOTALES	40

Fuente: Cálculos Propios HDSP

- Banco de Leche Humana
- Programa Canguro Ambulatorio y Hospitalario
- Estrategia Alojamiento Conjunto

Áreas Generales del Proyecto
“Construcción de la Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito”

Áreas		m2
1.	Área del Proyecto	
	Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal	345,0
	Unidad de Cuidado Intermedio y Básico Neonatal	365,0
	Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedia Pediátrica	558,0
	Banco de Leche Humana	106,5
	Programa Canguro Ambulatorio y Hospitalario	323,0
	Estrategia Alojamiento Conjunto	249,0
	Vacunación	29,0
	Áreas de corredores, patios y jardines	802,5
	Subtotal Área del Proyecto	2.778,0
2.	Circulación desde Gineco-Obstetricia	347,0
3.	Circulación desde Hospitalización	146,9
4.	Cubierta de Acceso (ambulatoria)	52,0
	Subtotal Áreas 2, 3 y 4	545,9
	GRAN TOTAL	3.323,9

El proyecto hace parte de la Etapa 5 del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria, y su ubicación corresponde en la zona verde posterior a la obra de las 14 Suites de Hotelaría Hospitalaria y una parte de la cancha de fútbol.



**Avance del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios E Infraestructura Hospitalaria
A 8 de septiembre de 2022**

Etapa	Detalle	Proyectos / Obras	Avances
1	Reordenamiento de los Servicios de Apoyo Logístico.	Bodega	Inicio de Obra en Junio de 2020 - Entregado en Febrero de 2021
		Parqueaderos para vehículos automotores y módulo de limpieza y desinfección de las Ambulancias.	Entregado en diciembre de 2019
		Área de Servicios Generales.	En desarrollo durante el 2022
2	Reordenamiento de las Áreas Administrativas y Algunos Servicios de Consulta Externa, para dar apertura de nuevos servicios asistenciales y ampliación de otros existentes (Cuando se desarrolle la Etapa 1)	Consulta Externa.	
		Unidad de Cardiología - Hemodinamia.	Aprobado en Plan Bienal 2018-2019 Ajuste 1
		Unidad de Neurología.	
		Ampliación Banco de Sangre.	Aprobado en Plan Bienal y etapa de prediseños arquitectónicos + PMA
		Consultorio de Apoyo. Laboratorio de Patología.	
3	Construcción de una Subestación Eléctrica para ampliación de la capacidad instalada y cumplimiento de los reglamentos en cuanto a redes eléctricas (RETIE, RETILAP, RITEL y similares).	Subestación Eléctrica	Aprobado Plan Bienal 2020-2021 Ajuste 1
4	Ampliación Área de Laboratorio Clínico	Ampliación del Laboratorio Clínico.	Aprobado Plan Bienal 2016-2017 - Avance prediseños arquitectónicos + PMA
5	Proyectos: UCI Neonatal y UCI Pediátrica.	UCI Neonatal y UCI Pediátrica.	En el 2021 ajustada nuevamente la capacidad instalada. Durante el 2022: Aprobada la capacidad instalada (incluye PMA) por SSDH y Minsalud. El pasado 5 de septiembre Minsalud aprobó la propuesta Arquitectónica y se autorizó el inicio de diseños y estudios de las ingenierías y el proyecto de inversión para gestionar su viabilidad definitiva durante el 2022 e inicio de obras en el 2023.
5	Unidad de Nefrología	Unidad de Nefrología.	En el 2018 y 2019 se realizaron estudios y diseños, se presentó el proyecto a SSDH, se deben realizar ajustes y volverlo a presentar para su viabilización.
6	Ampliación Salas de Cirugía y Ampliación de la Unidad de Esterilización (2019-2020).	Ampliación Salas de Cirugía y Ampliación de la Unidad de Esterilización.	Aprobado Plan Bienal 2020-2021 Ajuste 1
7	Proyectos a Futuro - Zona Verde desde la garita y alrededores de La PTAR.	Facultad de Medicina con su respectivo parqueadero.	
		Bloque Torre Consultorios y su área de parqueo.	
		Bloque Desarrollo Institucional (Gerencia, y Áreas Administrativas).	
		Bloque de Terapias: Física, Respiratoria, Ocupacional y Trauma.	
		San Antonio Gourmet.	Aprobado Plan Bienal 2016-2017 Ajuste 3
	Ampliación Parqueadero para Usuarios y Visitantes.		
7	Proyectos a Futuro- Zona posterior 14 Suites y UCIS (cancha de fútbol).	Áreas de Apoyo.	
		Bloque Desarrollo Institucional: Hospitalización 3 pisos.	
		Área Proyectos a Futuro: Desarrollo Institucional.	
		Unidad de Cancerología Surcolombiana. Área Futuro Parqueo.	

3. PROYECTOS INSCRITOS Y APROBADOS EN EL PLAN BIENAL 2022-2023

RESUMEN DE LOS PROYECTOS Y VALORES ESTIMADOS EN EL PLAN BIENAL 2022-2023

Sumatoria en Millones de Pesos De los Proyectos Registrados en el Plan Bienal 2022-2023	
A. Proyectos de Infraestructura (18)	\$ 64.410
B. Proyectos de Dotación y Equipos Médicos (9)	\$ 28.661
TOTALES	\$ 93.071

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN BIENAL 2022-2023

A. Proyectos de Infraestructura

(En millones de Pesos)

No.	Proyecto	Tipo de Obra	Área (m ²)	En millones de pesos	Período	FUENTE
1	Construcción obras de reforzamiento estructural.	4.Reforzo estructural	735	\$ 1.700	2016-2017	PGN
2	Ampliación y remodelación de laboratorio clínico y banco de sangre.	2.Ampliación	500	\$ 950	2016-2017	PGN
3	Construcción del sistema de baterías sanitarias para las habitaciones de hospitalización medicina interna, médico quirúrgicos, pediatría y ginecología.	1.Obra nueva	1.500	\$ 1.600	2016-2017	PGN
4	Construcción de una unidad mental.	1.Obra nueva	2.000	\$ 5.000	2016-2017	DPTO
5	Construcción obras de estabilizacion del talud en el sector de la unidad de ginecología, obstetricia y unidad de cuidados intensivos.	4.Reforzo estructural	900	\$ 2.000	2016-2017	SGR
6	Remodelación del Sistema de Baterías Sanitarias para los Servicios Ambulatorios.	3.Remodelación	500	\$ 1.000	2016-2017 - Ajuste 2	PGN
7	Construcción del área de cafetería y restaurante para los visitantes, familiares, usuarios y comunidad en general del La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	150	\$ 400	2016-2017 - Ajuste 3	OTROS R.
8	Construcción de La Unidad de Cardiología en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	1.Obra nueva	350	\$ 1.500	2018-2019	PGN
9	Construcción de La Unidad Renal en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	1.Obra nueva	350	\$ 1.500	2018-2019	PGN

A. Proyectos de Infraestructura

(En millones de Pesos)

No.	Proyecto	Tipo de Obra	Área (m ²)	En millones de pesos	Período	FUENTE
10	Construcción de La Unidad para Hemodinamia en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	1.Obra nueva	350	\$ 2.000	2018-2019 - Ajuste 1	PGN
11	Construcción de La Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	2.400	\$ 8.500	2018-2019 - Ajuste 2	PGN
12	Construcción de La Central de Mezclas de Medicamentos en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	250	\$ 800	2018-2019 - Ajuste 3	PGN
13	Construcción, ampliación y remodelación de las nuevas áreas de cirugía general y de esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	600	\$ 2.160	2020-2021 Ajuste 1	PGN
14	Diseño y Construcción de la Nueva Subestación Eléctrica Fase 1 en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	400	\$ 6.000	2020-2021 Ajuste 1	PGN
15	Construcción, Adecuación y Reorganización para el Archivo General de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	3.Remodelación	822	\$ 1.300	2020-2021 Ajuste 2	PGN
16	Construcción de la Unidad de Servicios Integrales Pediátricos en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	2.000	\$ 9.000	2022-2023	PGN
17	Construcción y Ampliación del Área de Consulta Externa de Medicina Especializada y Procedimientos Especializados en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	2.000	\$ 9.000	2022-2023	PGN
18	Construcción de la Unidad Funcional Integral de Cancerología en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	1.Obra nueva	2.000	\$ 10.000	2022-2023	PGN
TOTALES				\$ 64.410		

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN BIENAL 2022-2023

B. Proyectos de Dotación y Equipos Médicos

(En millones de Pesos)

No.	Proyecto	Valores	Período	FUENTE
1	Dotación de un microscopio quirúrgico para la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Huila.	\$ 911	2016-2017 - Ajuste 1	MINSALUD
2	Gestión del proyecto para la adquisición de dotación de equipos biomédicos y mobiliario para la Unidad Mental.	\$ 6.000	2016-2017 - Ajuste 2	DPTO
3	Gestión del proyecto para la adquisición de dotación de equipos biomédicos y mobiliario para La Unidad de Cardiología en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	\$ 2.500	2018-2019	PGN
4	Gestión del proyecto para la adquisición de dotación de equipos biomédicos y mobiliario para La Unidad Renal en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	\$ 3.000	2018-2019	PGN
5	Gestión del proyecto para la adquisición de dotación de equipos biomédicos y mobiliario de La Unidad para Hemodinamia en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.	\$ 4.000	2018-2019 - Ajuste 1	PGN
6	Gestión del proyecto para la dotación de equipos biomédicos y mobiliario de La Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	\$ 6.000	2018-2019 - Ajuste 2	PGN
7	Dotación de equipos biomédicos y mobiliario para las nuevas áreas de cirugía general y de esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	\$ 3.600	2020-2021 Ajuste 1	PGN
8	Dotación de una Planta Eléctrica para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito	\$ 850	2020-2021 Ajuste 2	PGN
9	Dotación y Renovación de Equipos Biomédicos para el Fortalecimiento de los Principales Servicios Asistenciales de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.	\$ 1.800	2020-2021 Ajuste 3	PGN
TOTALES		\$ 28.661		

Fuente: Proceso Planeación Operativa - 8 de septiembre de 2022.

Nota: Es necesario aclarar que los valores registrados en las tablas anteriores, algunos corresponden a vigencias 2016 en adelante, por consiguiente, son estimaciones del costo aproximado de los proyectos, cuyo valor definitivo se tendrá cuando se avancen en ellos y se tenga el presupuesto con base en los estudios y diseños.

4. PROYECTOS PRIORIZADOS 2020-2024

Para finalizar, se relacionan los proyectos priorizados en materia de infraestructura hospitalaria para el período de gestión 2020-2024, los cuales a pesar de las dificultades y escasez de recursos en los diferentes niveles del Estado Colombiano y el impacto de la pandemia COVID-19, se continuarán gestionando para el beneficio y desarrollo de nuestras comunidades:

1. Construcción de La Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.
2. Diseño y Construcción de la Nueva Subestación Eléctrica Fase 1 en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.
3. Construcción, Adecuación y Reorganización para el Archivo General de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.
4. Construcción de La Unidad Renal en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila.

A medida que se avance en los anteriores proyectos, se gestionará de forma simultánea la respectiva dotación de equipos biomédicos y no biomédicos para la puesta en funcionamiento de los mismos, situación que nos ha caracterizado desde la vigencia 2012 hasta la fecha.

Es de vital importancia contar con el apoyo y participación como siempre lo han hecho por parte de los Honorables Miembros de nuestra Junta Directiva, al igual que las entidades que nos apoyan en sus diferentes roles, a los proveedores, contratistas, a todos nuestros servidores, a nuestros usuarios y sus familiares, al igual que los diferentes grupos de valor para realizar el trabajo mancomunado que se requiere en nuestro proceso de la Acreditación Institucional, en donde la Gestión del Riesgo es un eje transversal a todos los procesos de la institución.


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente

Anexo. No. 1

**Acuerdo No. 009 de 27 de Septiembre de 2018 –
Por el cual se aprueba el Plan Maestro de
Reordenamiento Físico de Servicios e
Infraestructura Hospitalaria para La E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito.**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA
CALLE 3ª SUR N° 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04
NIT: 8-91180134-2



ACUERDO 009 2018

(27 de Septiembre)

“Por el cual se aprueba el PLAN MAESTRO DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO”

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA, En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas por los Acuerdos No 001 de 1995, Acuerdo 004 del 27 de Enero de 1997 y el Acuerdo 003 del 27 de Enero de 1997 y,

CONSIDERANDO:

1.-Que en cumplimiento del Plan de Gestión para el período 2016-2020 “Desarrollo y transformación hospitalaria con gestión humana” de La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA se hace necesario proyectar de forma integral la organización de la infraestructura hospitalaria para la prestación de nuevos servicios que a futuro se requieran, incluyendo el mejoramiento o ampliación del área administrativa en acatamiento de las normas urbanísticas, de habilitación, demanda de servicios y requerimientos institucionales.

2.-Que la planeación institucional es un principio de primer orden que debe observarse para que las áreas, obras y servicios se optimicen técnicamente, atendiendo a los estándares establecidos por las autoridades de salud públicas y a la solución de necesidades de la población sur huilense.

3.- Que con fundamento en el avance y desarrollo que ha tenido la institución en los últimos ocho (8) años respecto a la ampliación de la oferta de servicios de mayor complejidad que van en consonancia al perfil epidemiológico de la comunidad, como también al incremento creciente del número de usuarios, impulsa a las autoridades del nivel directivo concededores tanto de las necesidades como de las potencialidades de respuesta a los requerimientos de ampliación de servicios integrales; se revise la infraestructura hospitalaria y se adopten las mejores decisiones que correspondan a los conceptos de planeación y desarrollo armónico acorde con la distribución de las áreas físicas existentes que demandan del análisis cuidadoso en perspectiva al corto, mediano y largo plazo..

4.- Que el resultado de la planeación y proyección técnica de la infraestructura física existente que se propone está dado por los respectivos planes bienales para los períodos 2016-2017 y 2018-2019 con sus respectivos ajustes que incluye la dotación de equipos médicos acorde con las necesidades presentadas, lo cual se convertirá en un instrumento



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3º SUR N° 1B-45

TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



técnico de planeación institucional que facilitará la construcción de proyectos, articulación de esfuerzos interinstitucionales y el cumplimiento de los estándares de habilitación que periódicamente se hacen más exigentes.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Maestro de Reordenamiento físico de servicios e infraestructura hospitalaria para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito cuyo estudio técnico hará parte integral del presente acuerdo.


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación

En la Ciudad de Neiva a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho (2018).


DR. JOSÉ NELSON POLANÍA TAMAYO
Presidente de la Junta Directiva


DRA. DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Secretaria Ejecutiva Junta Directiva

PROPUESTA DE UN PLAN MAESTRO DE REORDENAMIENTO FÍSICO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

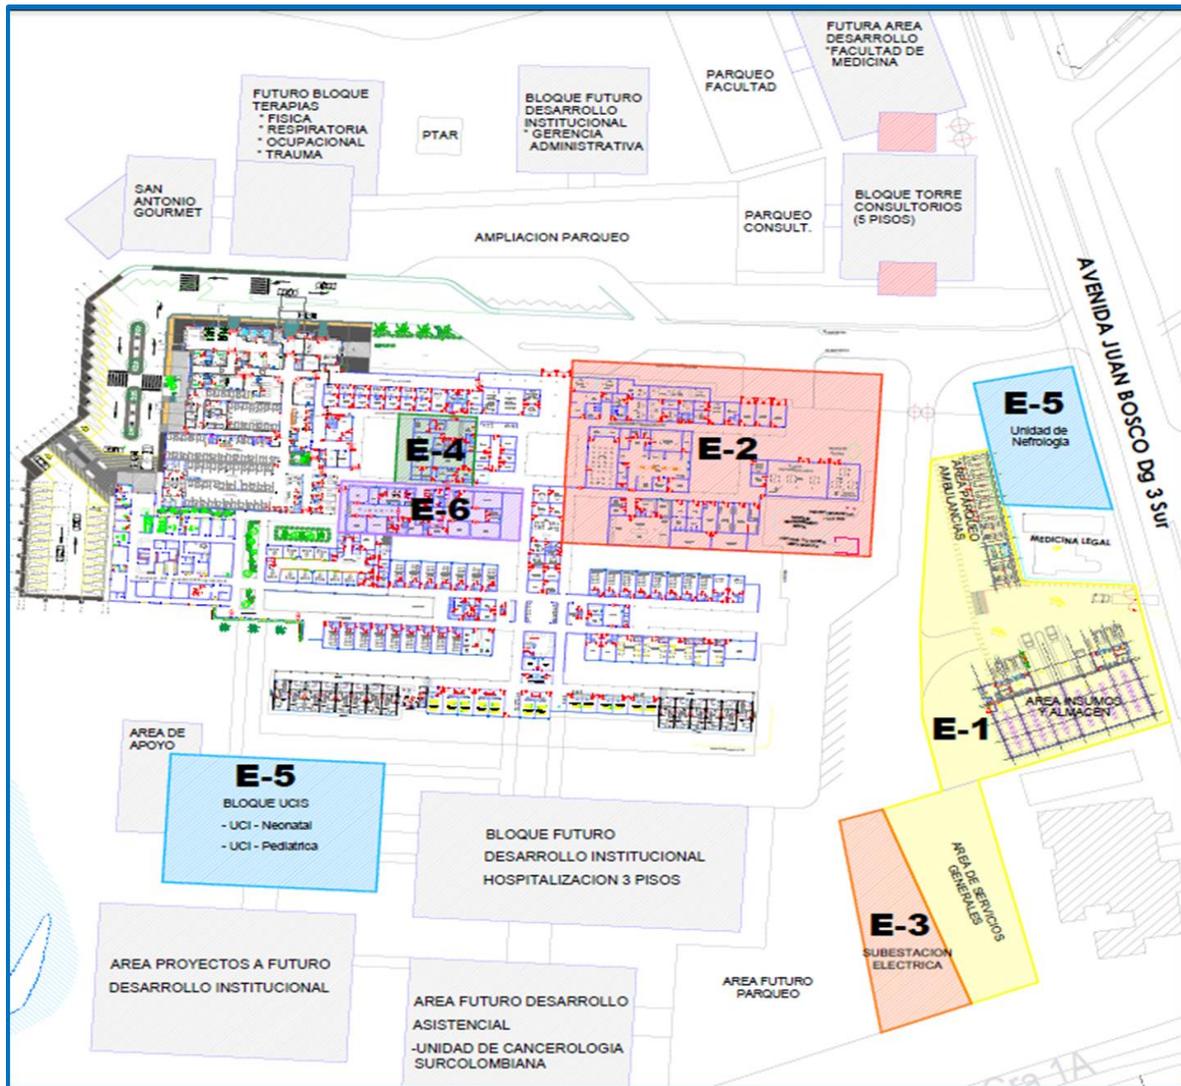

Pitalito, 25 de septiembre de 2018

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente

CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN	3
1. Proyecciones del Plan de Gestión 2016-2020	4
2. Gestiones Adelantadas y Resultados Obtenidos	6
3. Tareas por Ejecutar	23
4. Proyecciones a Corto, Mediano y Largo Plazo	25

JUSTIFICACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Gestión Institucional para el período 2016-2020 **“Desarrollo y Transformación Hospitalaria Con Gestión Humana”** de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en especial los relacionados con Dirección y Gerencia; se presenta ante La Honorable Junta Directiva de la institución y comunidad en general el presente informe denominado “Propuesta de un Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios E Infraestructura Hospitalaria, para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito”.

El presente informe, permite evidenciar en forma cronológica desde la vigencia 2012 hasta la fecha el proceso adelantado en materia de infraestructura hospitalaria de la entidad, tomando como base los respectivos Planes de Gestión y lo consignado en los Planes Bienales con los respectivos ajustes para cada período.

En el punto dos (2) del presente documento, se registran todas las gestiones adelantadas y resultados obtenidos, relacionados con los proyectos de infraestructura para la prestación de nuevos servicios de salud, al igual que los relacionados con el mejoramiento o ampliación de áreas administrativas teniendo en cuenta los diferentes modelos funcionales e integración de estos.

En el punto tres (3), se detallan las tareas por ejecutar a la fecha teniendo en cuenta el Plan de Gestión vigente, y aquellas que se encuentran en avance significativo para poder consolidarlas y llevarlas a feliz término. Finalmente, se presentan las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, basados en una propuesta de Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios E Infraestructura Hospitalaria que requiere nuestra entidad, para que siga avanzando en forma organizada y proyectada a la solución de necesidades de nuestra población Surcolombiana.

Por último, se hace extensiva la invitación a las diferentes instituciones del orden Municipal, Departamental y Nacional, para continuar con el trabajo articulado y apoyo incondicional como se ha venido realizando, con la finalidad del logro de los objetivos Institucionales con éxito en beneficio de nuestra región.

1. PROYECCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2016-2020

Teniendo en cuenta el avance y desarrollo que ha tenido nuestra entidad, en lo relacionado con la ampliación de oferta de servicios de mayor complejidad que van en consonancia con el perfil epidemiológico de nuestra comunidad; al igual que el incremento del número de usuarios vigencia tras vigencia; se hace necesario una revisión a la infraestructura hospitalaria con la que se cuenta actualmente y la proyectada para visionar dicha capacidad instalada, para poder crecer en forma organizada y positiva, aprovechando las bondades de los terrenos de la institución. Para ello, es necesario en primera instancia observar las proyecciones que tenemos en la materia como carta de navegación de nuestro Plan de Gestión **“Desarrollo y Transformación Hospitalaria Con Gestión Humana 2016-2020”**.

En la **meta A5**. Tenemos: “Gestión de los Proyectos de Infraestructura y los Proyectos de Dotación y Equipos Médicos del presente plan de gestión”.

- Estrategias:

1. Realizar las gestiones pertinentes para el trámite respectivo de la documentación y cofinanciación de los recursos con fuentes del orden Departamental y Nacional.
2. Ejecutar los diferentes estudios técnicos requeridos para los proyectos a desarrollar.

No.	Proyectos de Inversión: Infraestructura y Dotación de Equipos Biomédicos	PRESUPUESTO APROXIMADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
1.	Construcción de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)	\$446	Cofinanciación: Ministerio de Salud y Protección Social \$400,4 millones aproximadamente, y \$45,6 millones con recursos propios.
2.	Remodelación y adecuación del servicio de imágenes diagnósticas	\$450	Reorganización de las áreas destinadas para Rayos X, y TAC; y destinar el área para el servicio de Resonancia Magnética Nuclear - RMN. Proyecto que se ejecutará con recursos propios.
3.	Gestión del Proyecto para la Adquisición de equipos biomédicos para imágenes diagnósticas y digitalización de imágenes (Incluyendo el RMN)	\$6.000	Proyecto que será cofinanciado con recursos del Departamento Del Huila, recursos propios, y otras fuentes.
4.	Gestión del Proyecto Construcción de la unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica	\$3.500	Proyecto que será cofinanciado con recursos de la Nación, del Departamento Del Huila, recursos propios y otras fuentes.
5.	Gestión del Proyecto para la Adquisición de dotación de equipos biomédicos para la unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica	\$3.000	Proyecto que será cofinanciado con recursos de la Nación, del Departamento Del Huila, recursos propios y otras fuentes.
6.	Gestión para la Construcción de la Unidad de Salud Mental.	\$8.000	Proyecto que será cofinanciado con recursos de la Nación, del Departamento Del Huila, recursos propios y otras fuentes.
7.	Gestión para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario para la Unidad de Salud Mental.	\$6.000	Proyecto que será cofinanciado con recursos de la Nación, del Departamento Del Huila, recursos propios y otras fuentes.

No.	Proyectos de Inversión: Infraestructura y Dotación de Equipos Biomédicos	PRESUPUESTO APROXIMADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
8.	Gestión del Proyecto para la Ampliación y remodelación del área de hospitalización pensión	\$2.500	El proyecto en vigencias anteriores ha sido presentado y radicado en Planeación Departamental. Se gestionará cofinanciación a nivel departamental y nacional.
9.	Gestión para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario para la ampliación del servicio de Hospitalización.	\$3.500	El proyecto en vigencias anteriores ha sido presentado y radicado en Planeación Departamental. Se gestionará cofinanciación a nivel departamental y nacional.
TOTAL PROYECTOS		\$33.396	

Nota: Los valores de los proyectos anteriores son estimados, los cuales serán ajustados de acuerdo a los estudios técnicos y precios del mercado.

Y en la **meta A6. Hospital Universitario:** La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito, seguirá avanzando en las fases de cumplimiento normativo para lograr la graduación de Hospital Universitario, para convertirse en un centro generador de capital humano y de conocimiento para la transformación social al servicio del Sur de Colombia.

- Estrategias:

1. Desarrollar las fases de cumplimiento normativo en forma oportuna, contando con un equipo de trabajo técnico y el capital humano idóneo.
2. Fortalecimiento de los convenios para las prácticas formativas, en el marco de la relación docencia servicio.
3. Diseñar e incluir procesos internos orientados a la formación investigativa.
4. Contar con la vinculación de docentes que garanticen la idoneidad y calidad científica, académica e investigativa.
5. Adecuar espacios para la docencia y para el bienestar de docentes y estudiantes.

Así mismo, en el tema objeto de estudio del presente documento, “**El desarrollo y visión de la infraestructura hospitalaria**”, se puede citar que se ha tenido en cuenta lo formulado y registrado en los respectivos planes bienales para los períodos 2016-2017 y 2018-2019 con sus respectivos ajustes, donde se han incorporado proyectos de infraestructura y de dotación de equipos médicos, acorde a las necesidades y proyecciones que se evidencian en el presente informe.

2. GESTIONES ADELANTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Las diferentes gestiones adelantadas y resultados obtenidos en materia de proyectos tendientes al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, se han desarrollado entre otros aspectos teniendo en cuenta lo siguiente:

- Mejoramiento de la infraestructura, aprovechando al máximo los espacios actuales y los proyectados para el hospital.
- Para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y sus familiares y/o acompañantes, en cuanto a: Nuevos servicios médicos especializados, procedimientos, evitar desplazamientos a otras IPS ubicadas en ciudades capitales, y similares.
- Planeando la intercomunicación del nuevo servicio a ofertar con los servicios médicos, de apoyo diagnóstico, y similares existentes, al igual que los proyectados en el corto, mediano y largo plazo.
- Para el cumplimiento de estándares de Habilitación con enfoque en Acreditación.
- Optimizar el modelo funcional de las diferentes áreas asistenciales y áreas administrativas, teniendo en cuenta la eficiencia y comodidad de nuestros servidores (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).
- Teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones normativas vigentes: Sismo resistentes (NSR10), El Programa Territorial de Reorganización, rediseño y modernización de las redes de Empresas Sociales del Estado-E.S.E. (Art. 156 - Ley 1450 de 2011); los reglamentos en cuanto a redes eléctricas (RETIE, RETILAP, RITEL, y similares); normatividad para gases medicinales, al igual que para el manejo de sistemas de ventilación mecánica, sistemas hidráulicos y sanitarios, los residuos hospitalarios y aquellos en materia ambiental.
- Priorizando las recomendaciones y/o acciones de mejora del informe de MINSALUD, Aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH.
- Por sugerencias o recomendaciones de un ente de control, inspección, seguimiento y vigilancia.
- Otros, relacionados con la valoración del impacto social, ambiental, financiero, y similares.

Con base en lo anterior, se presenta un resumen de las gestiones y resultados obtenidos en las metas A5 y A6, por cuanto estos han sido presentados anualmente y publicados en nuestra página web.

VIGENCIA 2013:

1. Terminación de la Construcción del Servicio de Urgencias y obras de Urbanismo (Fase I) \$2.707.000.000. La obra fue entregada al servicio de la comunidad el 01 de febrero de 2013.



2. Adquisición de equipos para el proyecto farmacia unidosis, \$25.950.680.

- Selladora Re-empacadora Automática Neumática Modelo S.A.N40



- Cabina de Flujo Laminar Vertical



- Impresora Zebra para código de Barras – Ref. ZM400



VIGENCIA 2014:

3. Ampliación y remodelación de la Unidad de Urgencias (Fase II), \$1.330.000.000. La obra fue terminada el 24 de abril de 2014.



4. Gestión para la obtención de los equipos médicos necesarios para el funcionamiento de la Ampliación de Urgencias, \$1.454.033.731 (Cofinanciación del Departamento del Huila \$1.394.033.731, y el Hospital \$60.000.000).

CT/OC	Contratista	Fecha	Objeto	Vr. Ejecutado
CT.078	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA Y DE INSUMOS MÉDICOS CFIM S.A.S.	20/03/2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS CON SUS ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 1.454.033.731

GRUPO 1. Muebles de Uso Hospitalario

ÍTEM	ELEMENTO	MARCA	CANTIDAD
1	CAMA ELECTROMECÁNICA	STRYKER	37
2	CAMILLA FIJA	DOMETAL	6
3	CAMILLA DE REANIMACIÓN	STRYKER	13
4	CAMILLA DE TRAUMA	STRYKER	1
5	CAMILLA DE TRANSFERENCIA	STRYKER	4
6	CARRO DE MEDICAMENTOS	TECNO SALUD	4
7	CARROS DE PARO	TECNO SALUD	6
8	CUNA PEDIÁTRICA	STRYKER	11
9	ESCALERILLA DE UN PASO	DOMETAL	12
10	MESA DE CURACIÓN	DOMETAL	20
11	MESA DE MAYO	DOMETAL	3
12	MESA DE NOCHE	DOMETAL	48
13	MESA DE PUENTE	DOMETAL	13
14	NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS	DOMETAL	9
15	SILLAS DE RUEDAS	DOMETAL	5
TOTALES			192

GRUPO 2. Equipo Médico y Biomédico

ÍTEM	ELEMENTO	MARCA	CANTIDAD
1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	10
2	BALANZA DE PIE	HEALT O METER	10
3	DEFIBRILADORES	PHILIPS	6
4	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	4
5	EQUIPO DE ÓRGANO DE PARED	WELCH ALLYN	6
6	FLUJÓMETROS	IMETAN	56
7	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	14
8	FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO	WELCH ALLYN	5
9	LÁMPARA PIELÍTICA	DRAGER	1
10	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO HOJAS CURVAS	WELCH ALLYN	3
11	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO HOJAS DE RECTAS	WELCH ALLYN	3
12	LARINGOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	6
13	LINTERNA DE DIAGNÓSTICO	WELCH ALLYN	7
14	MONITOR MULTIPARÁMETROS	NIHON KODEN	11
15	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	11
16	OXÍMETRO DE PULSO	KONICA MINOLTA	9
17	PESA BEBE	HEALT O METER	4
18	NEVERA DE MEDICAMENTOS	TECNO SALUD	2
19	REGULADORES DE VACÍO	OHIO	4
20	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	1
21	TENSIÓMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	14
22	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO	WELCH ALLYN	5
23	TALLÍMETRO	KRAMER	6
24	VENTILADOR DE TRANSPORTE	J'MEDICS	1
TOTALES			199

5. Adquisición de Paneles Solares para el suministro de agua caliente, \$299.982.095, la obra fue recibida el 30 de mayo de 2014.



Otras Obras de Infraestructura realizadas con recursos propios, \$382.312.167

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS
VIGENCIA 2014
(Valores en pesos)**

No.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VR. EJECUTADO	OBSERVACIONES
1.	Adecuación y Remodelación de Espacios Físicos en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito.	\$ 25.335.300	Contrato No. 080 de 2014, donde se adecuó un consultorio (Antigua habitación de conductores) y adecuación del archivo central (Hospital y Predio Tía Mónica). La obra fue recibida mediante Informe de Supervisión del 30 de Abril de 2014.
2.	Construcción, Remodelación y Adecuación del Área de Facturación Hospitalización y del Depósito para Material Reciclable en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito.	\$ 17.933.173	Contrato No. 106 de 2014, Remodelación y adecuación del área de Facturación en Hospitalización y del Depósito para material reciclable. La obra fue recibida mediante Informe de Supervisión del 11 de Agosto de 2014.
3.	Obras de Remodelación del Área para la Prestación de los Servicios de Gastroenterología; Mejoramiento y Acondicionamiento de la Unidad de Urgencias; Del Plan de Contingencia como Auditorio y del Acceso a la Entrada Principal en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito.	\$ 339.043.694	Contrato No. 136 de 2014, por valor inicial de \$304 millones y una adición de \$35.043.694, para un total de \$339.043.694; y el Contrato No. 137 para la Interventoría por la suma de \$13.750.000 con recursos propios. La obra fue recibida mediante Acta Final del 26 de Noviembre de 2014.
TOTALES		\$ 382.312.167	

6. CONTRATO 080 / 2014 Adecuación y remodelación de espacios físicos en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito

Bodega de la Tía Mónica



7. CONTRATO 106 / 2014 Construcción, remodelación y Adecuación del Área de Facturación Hospitalización y del Depósito para Material Reciclable en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito

Depósito para Material Reciclable



Facturación Hospitalización



8. CONTRATO 136 / 2014 Obras de remodelación para la prestación de Servicios: Gastroenterología, Plan de Contingencia de Urgencias, Entrada Principal

Antes: Archivo de Historias Clínicas


Ahora: Unidad de Gastroenterología



Plan de Contingencia de Urgencias / Auditorios



Entrada Principal y Recepción



VIGENCIA 2015:

9. CONTRATO 109 / 2015 Construcción a todo costo Plazoleta Principal en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, por la suma de \$221.684.116.



10. Fase I – Hospital Universitario: Concepto dado por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, conformado por MINSALUD y Ministerio de Educación. Acuerdo No. 00246 de 04 de noviembre de 2015.



VIGENCIA 2016:

11. CONTRATO 131 / 2016 Construcción y puesta en funcionamiento a todo costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, por \$672.253.135

CT	CONTRATISTA	OBJETO	RECURSOS MINSALUD	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUTADO
131	Consortio E Y C Rojas	Construcción y puesta en funcionamiento a todo costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito	400.462.000	271.791.135	672.253.135




12. CONTRATO 137 / 2016 Adecuación y remodelación a todo costo de la Unidad de Imagenología, incluida el área para la puesta en funcionamiento del Resonador Magnético Nuclear en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, por \$602.394.619.



13. CONTRATO 190/2016 Adquisición de un Sistema de Información para Radiología y Reposición de Equipos Biomédicos para el Servicio de Imágenes Diagnósticas, por \$1.015.777.600.

14. CONTRATO 191/2016 Suministro de una Solución Integral de Hardware y Software que garantice el funcionamiento del RIS, PACS y su integración con el HIS para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, por \$269.000.000.

Monitor de Diagnóstico Clínico

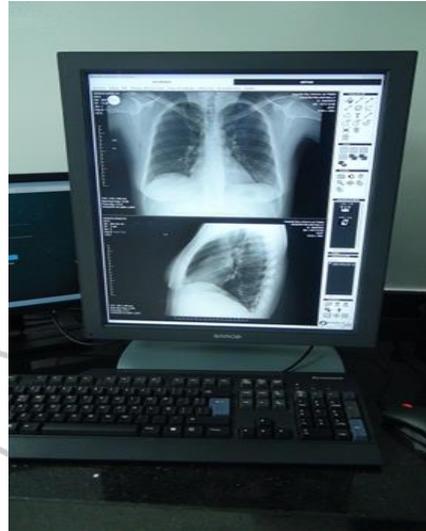

Digitalizador de Imágenes Diagnósticas -



Equipo de Rayos X Portátil



-Detector Flat Panel



Equipo de Rayos X Análogo



15. Gestiones para que MINSALUD priorizara al Hospital en la Evaluación del Nivel de Seguridad Frente a Desastres a través del Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH. Resultados que fueron publicados por MINSALUD en junio de 2017.



VIGENCIA 2017:

16. Mediante la Resolución No. 6392 de 26 de diciembre de 2016 El Ministerio de Salud y Protección Social, asignó la suma de \$30 millones que fueron invertidos en la construcción de diques de contención de derrames, en cumplimiento del punto 32 del componente no estructural, a través del Contrato No. 115 de 2017.

CT	CONTRATISTA	OBJETO	RECURSOS MINSALUD	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUTADO
115	DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE CÁRCAMOS PARA CUARTOS TÉCNICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.	29.799.094		29.799.094



17. Puesta en servicio el 12 de junio de 2017 del Resonador Magnético Nuclear (Philips – Multiva de 1,5 Tesla de campo). CONTRATO 172/2016 Prestación del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear por la Modalidad de Outsourcing en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Cuantía \$2.044.000.000



18. CONTRATO 43/2017 Construcción de la red de aguas lluvias para La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.

ANTES



DESPUÉS




19. CONTRATO 168/2017 Adecuación de Tanques de Almacenamiento de Agua, utilizando materiales sólidos, impermeables y resistentes a los procesos de limpieza y desinfección en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Cuantía \$32.950.625.

ANTES



DESPUÉS

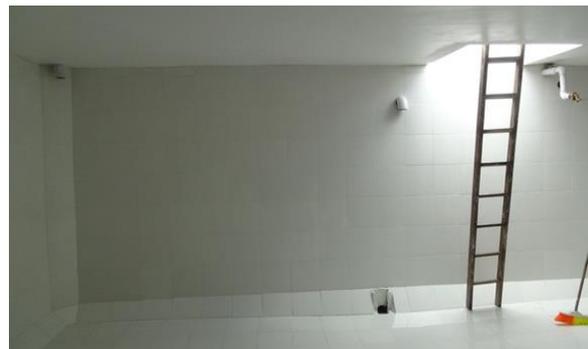

VIGENCIA 2018:

20. CONTRATO 102/2018 Adecuación de la Infraestructura Física de la Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Cuantía \$28.570.990.


ANTES



DURANTE



DESPUÉS

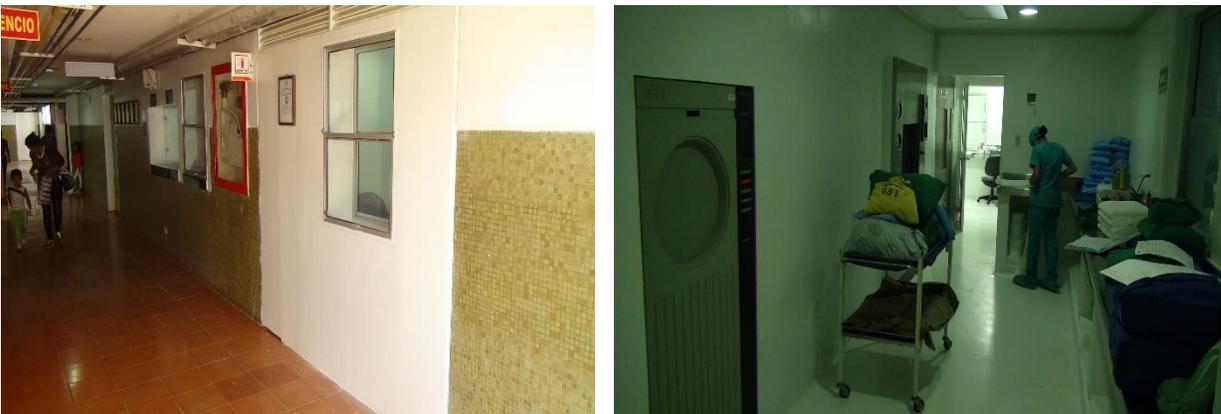

21. Mediante la Resolución No. 004157 de 25 de octubre de 2017 El Ministerio de Salud y Protección Social, asignó la suma de \$100 millones que fueron invertidos en los siguientes contratos: 116 de 2018 y 139 de 2018.

CT	CONTRATISTA	OBJETO	RECURSOS MINSALUD	RECURSOS PROPIOS	TOTAL EJECUTADO
116	OSCAR FELIPE TORRES JURADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIL DOSCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (1,207M2) DE PELÍCULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON GARANTÍA Y DENOMINACIÓN DE CUATRO (4) MICRAS PARA TODOS LOS VIDRIOS QUE HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	71.816.500		71.816.500

El contrato fue ejecutado a satisfacción, y con el desarrollo del mismo, se dio cumplimiento a las acciones de mejora de los puntos: 36 Seguridad puertas de vidrio, y del 37 Seguridad en Ventanas y ventanales, del componente no estructural.



22. Contrato de Prestación de Servicios No. 139 de 06 de agosto de 2018, cuyo objeto es Aseguramiento y fijación de Equipos de Oficina, vigilancia, médicos, estantería y vitrinas en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, conforme a las especificaciones y cantidades de la cláusula primera; por la suma de \$32.000.000. El contrato se encuentra en ejecución y tiene una duración de 60 días a partir de la firma del Acta de Inicio (13 de agosto de 2018). Con la ejecución del presente contrato, se dará cumplimiento a las acciones de mejora de los puntos: 30 al 32 relacionados con anclajes para la seguridad de estanterías, equipos de oficina, y el mobiliario hospitalario. El 39, 40

y 44 anclajes para las estanterías de los equipos y mobiliario en farmacia, esterilización y de contenidos médicos; del componente no estructural.

CT	CONTRATISTA	OBJETO	RECURSOS MINSALUD	RECURSOS PROPIOS	TOTAL CONTRATADO
139	WILLIAM ROJAS CABRERA	ASEGURAMIENTO Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, VIGILANCIA, MÉDICOS, ESTANTERÍA Y VITRINAS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 28.183.500	\$ 3.816.500	\$ 32.000.000

3. TAREAS POR EJECUTAR

1. Continuar con la ejecución del **Contrato No. 133 de 2018**, cuyo objeto es la Ampliación y remodelación del área de Hospitalización Pensión en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito Departamento del Huila. A la fecha, la obra reporta un avance aproximado del 5%, consistente en excavaciones y cimentación del terreno. **La cuantía contratada asciende a \$1.830.000.000.**



2. Simultáneamente al desarrollo del proyecto anterior, se está organizando con el equipo técnico de la entidad, la lista de los equipos y mobiliario necesario, para el desarrollo del proyecto denominado **Gestión del proyecto para la adquisición de dotación de equipos biomédicos y mobiliario para La Ampliación y Remodelación del Área de**

Hospitalización Pensión. Presupuestado en **\$3.500 millones** aproximadamente, con recursos propios del Hospital.

3. Seguir gestionando los recursos de cofinanciación para la **Dotación de un Microscopio Quirúrgico para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito del Departamento del Huila**, el cual tiene un costo aproximado de **\$1.618.000.000**, contando desde la vigencia 2017 con viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, y viabilización de la Secretaría de Salud del Huila desde la vigencia 2016.

4. Avanzar en la etapa precontractual y contractual para la **Dotación de una Planta Eléctrica para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito del Departamento del Huila**, por la suma de **\$327.800.000**, recursos aportados por El Ministerio de Salud y Protección Social, con base en la Resolución No. 5263 de 2017.

5. Progresar en las observaciones realizadas por parte de la Secretaría de Salud del Huila, al proyecto **Construcción de Una Bodega Tipo Industrial para Almacén y Suministros**, el cual se encuentra radicado en La Secretaría de Salud del Huila, donde bajo las acciones de coordinación se están haciendo los ajustes pertinentes para lograr los trámites respectivos de viabilidad de esta entidad y continuar con el mismo ante El Ministerio de Salud y Protección Social. El proyecto cuenta con los estudios y diseños requeridos, al igual que la licencia de construcción. El presupuesto estimado del proyecto es de **\$2.416.658.368** (incluye el valor de la interventoría), con un área aproximada Construida de 682,58m².

6. Adelantar las observaciones realizadas por parte de la Secretaría de Salud del Huila, al proyecto **Construcción del Área para realizar los procesos de limpieza y desinfección de las ambulancias, parqueo y área para patio de maniobras de vehículos hospitalarios, de insumos y de almacén del Hospital**, el cual se encuentra radicado en La Secretaría de Salud del Huila, donde bajo las acciones de coordinación se están haciendo los ajustes pertinentes para lograr los trámites respectivos de viabilidad de esta entidad. El proyecto cuenta con los estudios y diseños requeridos, al igual que la licencia de construcción. El monto estimado del proyecto es de **\$768.825.325** (incluye el valor de la interventoría), con las siguientes áreas: Construida 230,40m²; Para patio de maniobras 1.043,50m² y para andén perimetral 124,10m².

7. **Continuar con la Gestión de los Proyectos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Pediátrica y Unidad Renal.** Se ha visionado los terrenos donde se desarrollarían los presentes proyectos. Se decidió contratar con recursos propios la elaboración de los estudios y diseños arquitectónicos y complementarios para la construcción de estos proyectos, por la suma de **\$385 millones**. Se está realizando con un equipo técnico el respectivo anteproyecto para los trámites ante Secretaría de Salud del Huila y posteriormente ante El Ministerio de Salud y Protección Social.

8. Avanzar en el trabajo en equipo con La Secretaría de Salud del Huila, para la planeación y diseño del modelo funcional del proyecto **Gestión para la Construcción de**

la **Unidad de Salud Mental**, teniendo en cuenta el diseño de la red de servicios de salud mental del Huila.

9. Priorizar del Plan Bienal 2018-2019 con sus respectivos ajustes, aquellos proyectos de mayor interés y desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades de nuestras comunidades como se detalló en la página 6 del presente informe y el respaldo de las entidades del orden municipal, departamental y nacional, donde se cursan los respectivos trámites de viabilidad técnica y financiera para estos.

4. PROYECCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Retomando los puntos anteriores del presente informe: 1. PROYECCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 2016-2020, 2. GESTIONES ADELANTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS, y 3. TAREAS POR EJECUTAR; se hace necesario dar a conocer las proyecciones a corto, mediano y largo plazo de lo que se ha concebido a nivel gerencial como Propuesta de un Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria para nuestra institución, por las siguientes razones, entre otras:

- El Hospital debe desarrollar su infraestructura física en forma ordenada, orientada a la solución de problemas puntuales relacionadas al incremento de la capacidad o la modernización del establecimiento.
- Brindar un enfoque sistémico e integral en la prestación de los servicios de salud, para poder articular los servicios existentes con la nueva oferta de servicios proyectados en el tiempo.
- Promover la apertura de nuevos servicios de salud para nuestro hospital que requiere la comunidad Surcolombiana, y que estos queden respaldados en el nuevo documento de Red de Prestadores de Servicios de Salud para el Departamento del Huila.
- Contar con el respaldo del máximo órgano de administración del Hospital, para el desarrollo del presente Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria para nuestra entidad, con la finalidad de que las futuras gerencias cuenten con una carta de navegación en la materia y puedan gestionar los recursos requeridos para su realización, de la mano con los diferentes planes y programas para su implementación.
- Mitigar en todo tiempo los posibles riesgos y ejecutar las debidas contingencias, en la ejecución del Plan Maestro Hospitalario, para poder mejorar los resultados de la evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria –ISH, en cumplimiento del programa denominado “**Hospitales Seguros Frente a Desastres**”.


Para una mayor comprensión de la Propuesta del Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicios e Infraestructura Hospitalaria para nuestra entidad, se ha clasificado su ejecución a través de seis (6) etapas y proyectos a futuros; así:

- ETAPA 1. Reordenamiento de los Servicios de Apoyo Logístico (Diseños y obras en la vigencia 2018), como:

- Bodega
- Parquederos para vehículos automotores de La E.S.E. HSP y módulo de limpieza y desinfección de las Ambulancias.
- Área de Servicios Generales

ÁREAS ACTUALES

- Zona verde y antigua sede de la Cruz Roja.

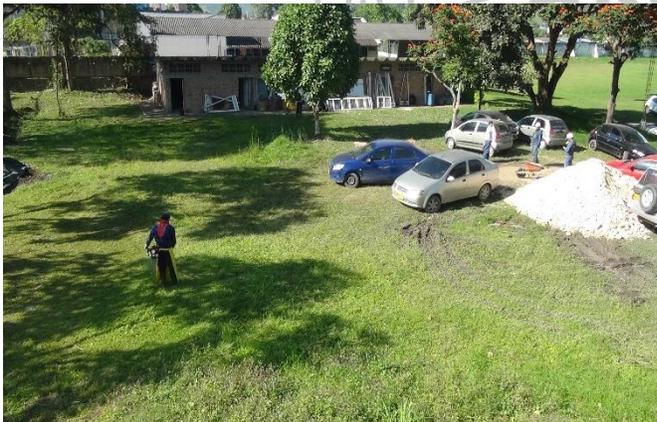

ÁREAS PROYECTADAS




- **ETAPA 2. Reordenamiento de las Áreas Administrativas y algunos Servicios de Consulta Externa, para dar apertura de nuevos servicios asistenciales y ampliación de otros existentes (Cuando se desarrolle la Etapa 1).**

ÁREAS ACTUALES: Contabilidad y Presupuesto, Cartera y Archivo Central, Tesorería, Taller 1 de Mantenimiento Hospitalario, Terapias y Rehabilitación, Consultorios 9 y 10, Audiovisuales y Control Interno, Bodegas 1 y 2, La Morgue, Cocina, Estadística y Planeación, Cuarto de Residuos Hospitalarios, Tanque de ACPM, Sala de Máquinas, Central de Gases Medicinales, Oficina y Taller 2 de Mantenimiento, Cuentas Médicas, Baños, Lavandería, Oficina de Procesos Ambientales y de Servicios Generales.

ÁREAS PROYECTADAS:

- Consulta Externa.
- Unidad de Cardiología – Hemodinamia.
- Unidad Neurológica.
- Ampliación Banco de Sangre.
- Consultorios de Apoyo.
- Laboratorio de Patología.

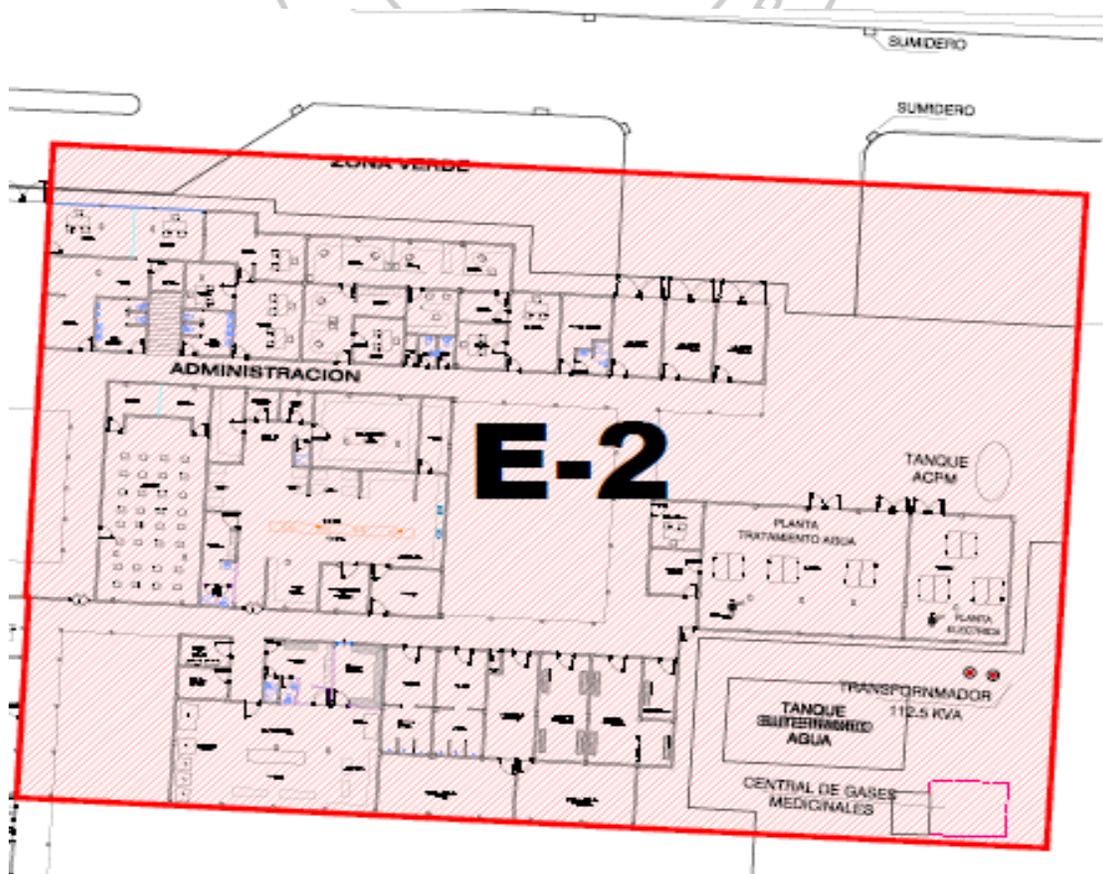

ETAPA 3. Construcción de una Subestación Eléctrica para ampliación de la capacidad instalada y cumplimiento de los reglamentos en cuanto a redes eléctricas (RETIE, RETILAP, RITEL, y similares). (Diseños en el 2018 y obra en 2019).


ÁREAS ACTUALES:

- Zona verde contiguo a la cancha de fútbol y linderos con El ICBF.



ÁREAS PROYECTADAS:

- Subestación Eléctrica

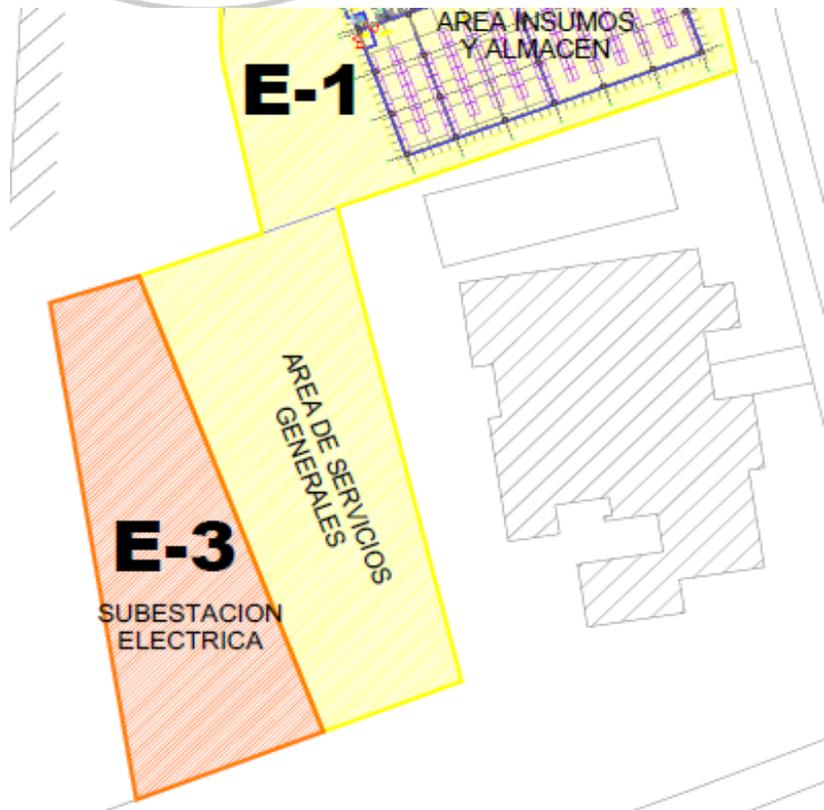

ETAPA 4. Ampliación Área de Laboratorio Clínico (Diseños y obra en la vigencia 2019).

ÁREAS ACTUALES: Servicio de Laboratorio Clínico y zona verde adyacente.



ÁREAS PROYECTADAS:




ETAPA 5. Proyectos: UCI Neonatal y UCI Pediátrica. (Diseños en el 2018 y obras en 2019).

ÁREAS ACTUALES: Zona verde posterior a la obra en construcción de las nuevas 14 habitaciones de hospitalización en el pabellón de Pensión, hasta la cancha de fútbol.



ÁREAS PROYECTADAS:

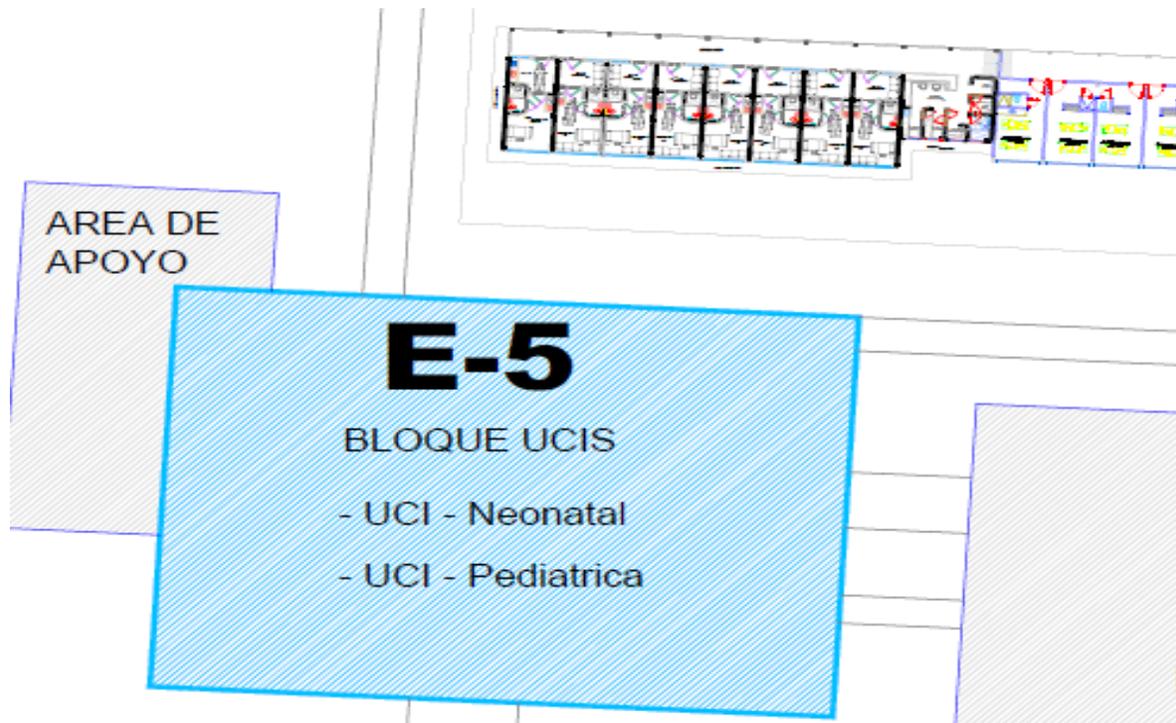


- Unidad de Nefrología. (Diseños en el 2018 y obras en 2019).

ÁREAS ACTUALES:

Zona verde donde se encuentra ubicado el pozo artesiano, con acceso a la vía principal de ingreso al hospital, hasta la actual sede de Medicina Legal.



ÁREAS PROYECTADAS:

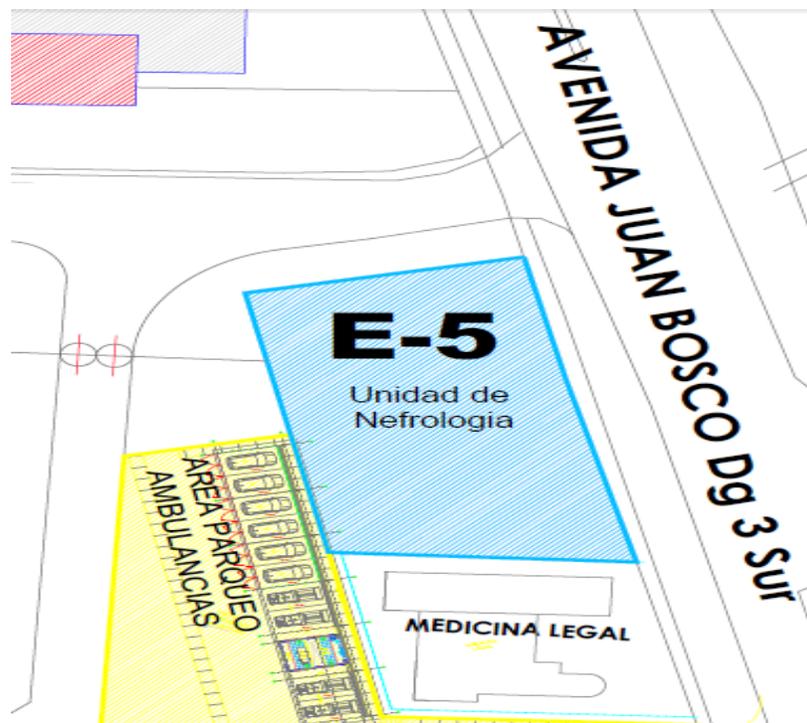

ETAPA 6. Ampliación Salas de Cirugía y Ampliación de la Unidad de Esterilización (2019-2020).

ÁREAS ACTUALES: Salas de Cirugía y Esterilización.



ÁREAS PROYECTADAS:




ETAPA 7. Proyectos a Futuro:

- Facultad de Medicina con su respectivo parqueadero.
- Bloque Torre Consultorios y su área de parqueo.
- Bloque Desarrollo Institucional (Gerencia y Áreas Administrativas).
- Bloque de Terapias: Física, Respiratoria, Ocupacional y Trauma.
- San Antonio Gourmet.
- Ampliación Parqueadero para usuarios y visitantes.

ÁREAS ACTUALES: Zonas verdes al frente de la entrada principal del Hospital (Consulta externa y urgencias), desde la garita y alrededores de La PTAR.



ÁREAS PROYECTADAS:

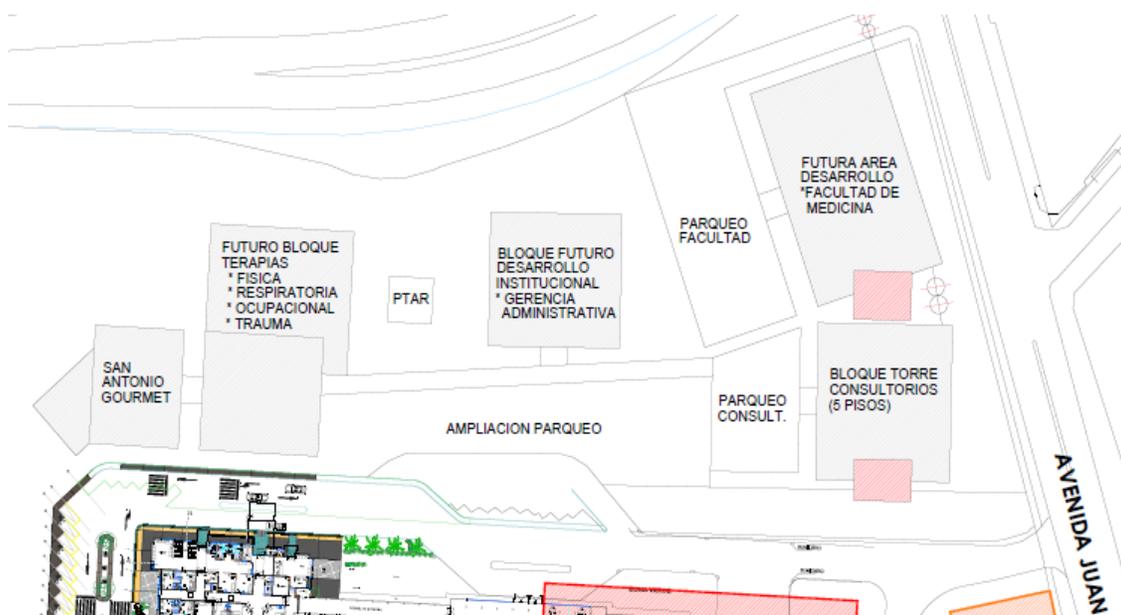


Proyectos a Futuro:

- Áreas de Apoyo.
- Bloque Desarrollo Institucional: Hospitalización 3 pisos.
- Área Proyectos a futuro: Desarrollo Institucional.
- Área Desarrollo Institucional: Unidad de Cancerología Surcolombiana.
- Área Futuro Parqueo.

ÁREAS ACTUALES: Zona verde posterior a la obra en construcción de las nuevas 14 habitaciones de hospitalización en el pabellón de Pensión, y de la proyección de La UCI Neonatal y UCI Pediátrica, hasta la cancha de fútbol.



ÁREAS PROYECTADAS:

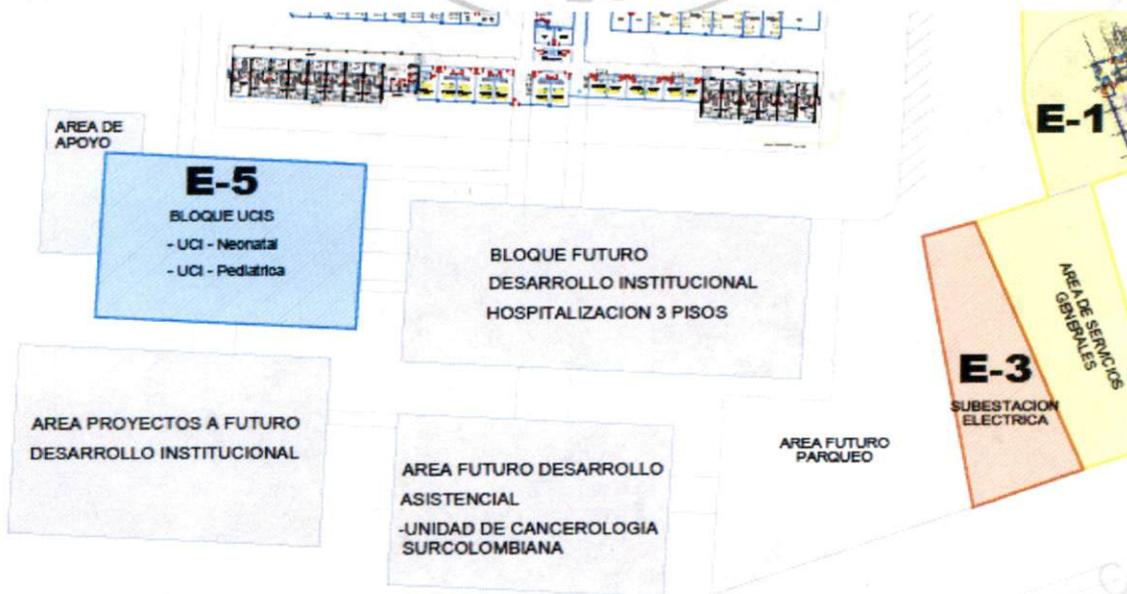


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente
